

SAFRAN



Un logiciel métier unique pour tous les ETS

Les bascules des établissements

Etat des lieux en 2005.

4 logiciels différents utilisés, autant de paramétrages que de régions.

le projet SAFRAN

C'est le projet d'uniformisation de l'informatique métier de l'EFS.

Il se compose en 3 phases :

- (0) La bascule de tous les ETS vers les logiciels Inlog en choisissant un paramétrage « parrain ».
- (1) La migration vers une base de données donneurs unique et nationale.
- (2) L'appropriation du logiciel en interne par les équipes de l'EFS

Le calendrier opérationnel

07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

**Pilotes
bascules**

PDL



ALPM




Objectif :
bascule le 08/12/06

PDL



PDL



Discussions à finaliser sur les
conséquences de la mise en
œuvre de Inlog 5.4

ALPM




ALPM



PDL



ALPM




ALPM



BFC



PDL



1 Début Préparation EFS régional
 2 Début des travaux sur site régional
 3 Début VA
 4 Début VA

↑ Jalon « livraison données »
 ↑ Jalon « bascule »

←→ Formations utilisateurs

■ PROGESA ■ MEDINFO ■ ITRB

Rappel des phases de la bascule

- Préparation nationale (terminée)
- Anticipation régionale (en cours)
- Intensification de la préparation régionale
- Vérification d'Aptitude et Bascule
- Vérification de Service Régulier et suivi du démarrage




Calendrier de la bascule pour l'EFSAL

- **ANTICIPATION RÉGIONALE:** a débuté lors du séminaire de lancement qui a eu lieu les 22 et 23 mai 2006
- **INTENSIFICATION DE LA PRÉPARATION RÉGIONALE:** présence en région d'une équipe du Groupement et de représentants de l'équipe nationale à partir du mois de mars 2007
- **VA puis BASCULE:** le 15 juin 2007 (sous réserve de modifications)
- **VSR et SUIVI DU DÉMARRAGE:** pendant 2 mois et demi par l'équipe du Groupement et l'équipe régionale



Planning Aquitaine Limousin

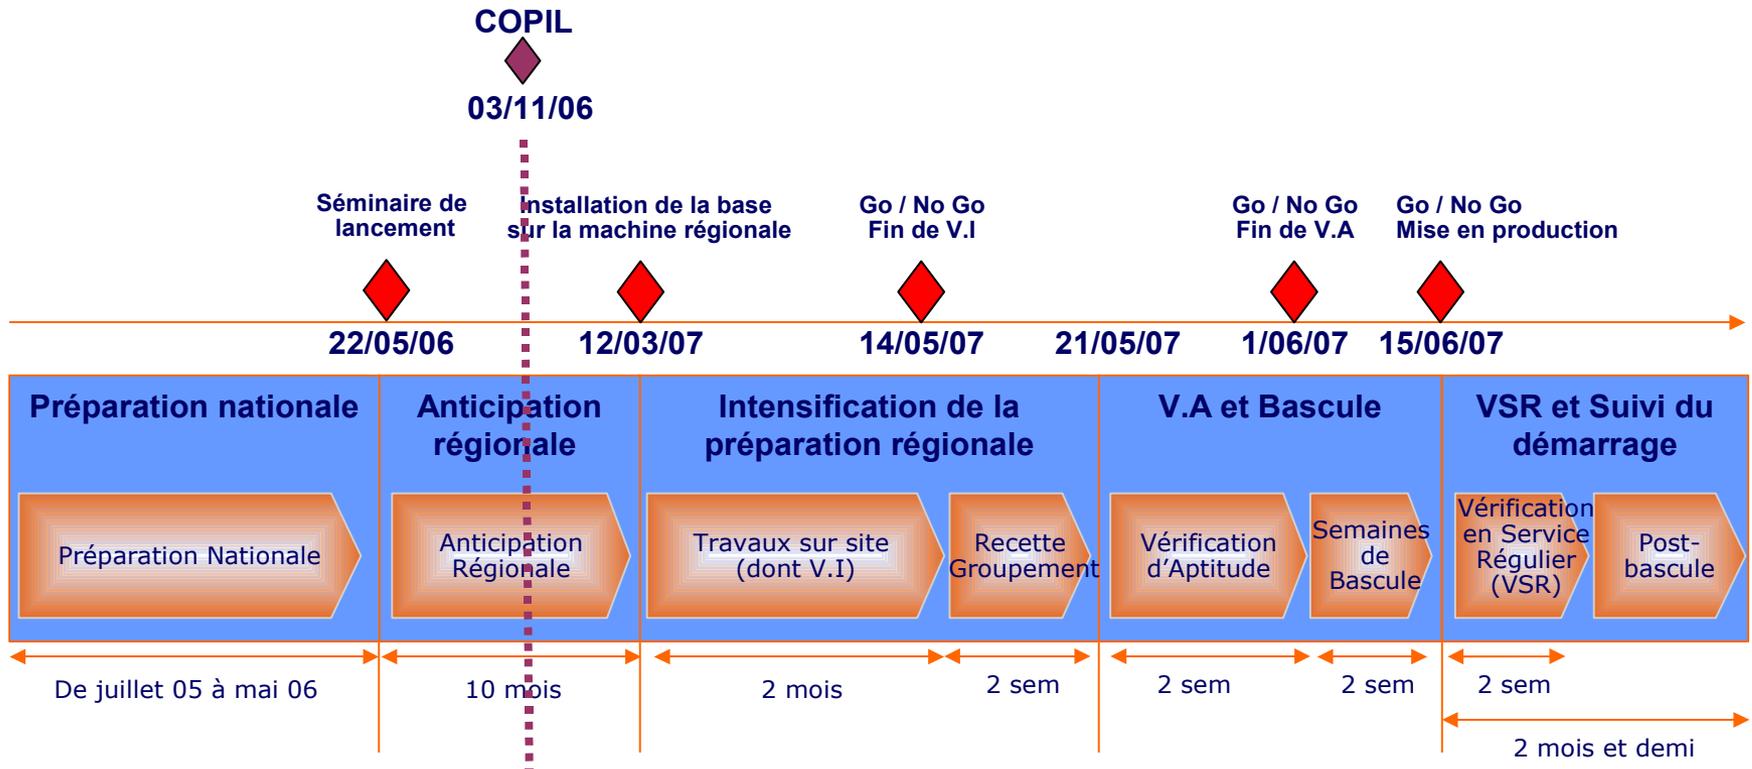

- Le planning est en cours de mise à jour.


Les différents chantiers à mener pour la bascule

- **DOMAINE PILOTAGE ET CONDUITE DU CHANGEMENT :**
 - Chantier Pilotage (COPIL- R et CAR)
 - Chantier Étude d'Impacts du paramétrage:
 - Mise à jour des processus métier
 - Mise à niveau de la documentation Qualité
 - Formation des utilisateurs aux changements
 - Chantier Formation des utilisateurs à l'outil Inlog + post-formation
 - Chantier Communication
- **DOMAINE BASCULE :**
 - Chantier Infrastructure / Exploitation
 - Chantier Interfaces / Connexions
 - Chantier Localisation du paramétrage
 - Chantier Reprise de Données / Transcodage
 - Chantier Recettes (VI et VA) et Bascule
 - Chantier Support de Niveau 1
 - Chantier Vérification en Service Régulier (VSR)

Ce qui a déjà été fait :

- Le séminaire de lancement (mai 2006)
- Constitution de l'équipe régionale Safran (diapositive suivante)
- Recensement du nombre de personnes à former pour chaque module dans chacune des trois villes de formation (Bordeaux - Limoges – Mont de Marsan)

La composition de l'équipe régionale SAFRAN

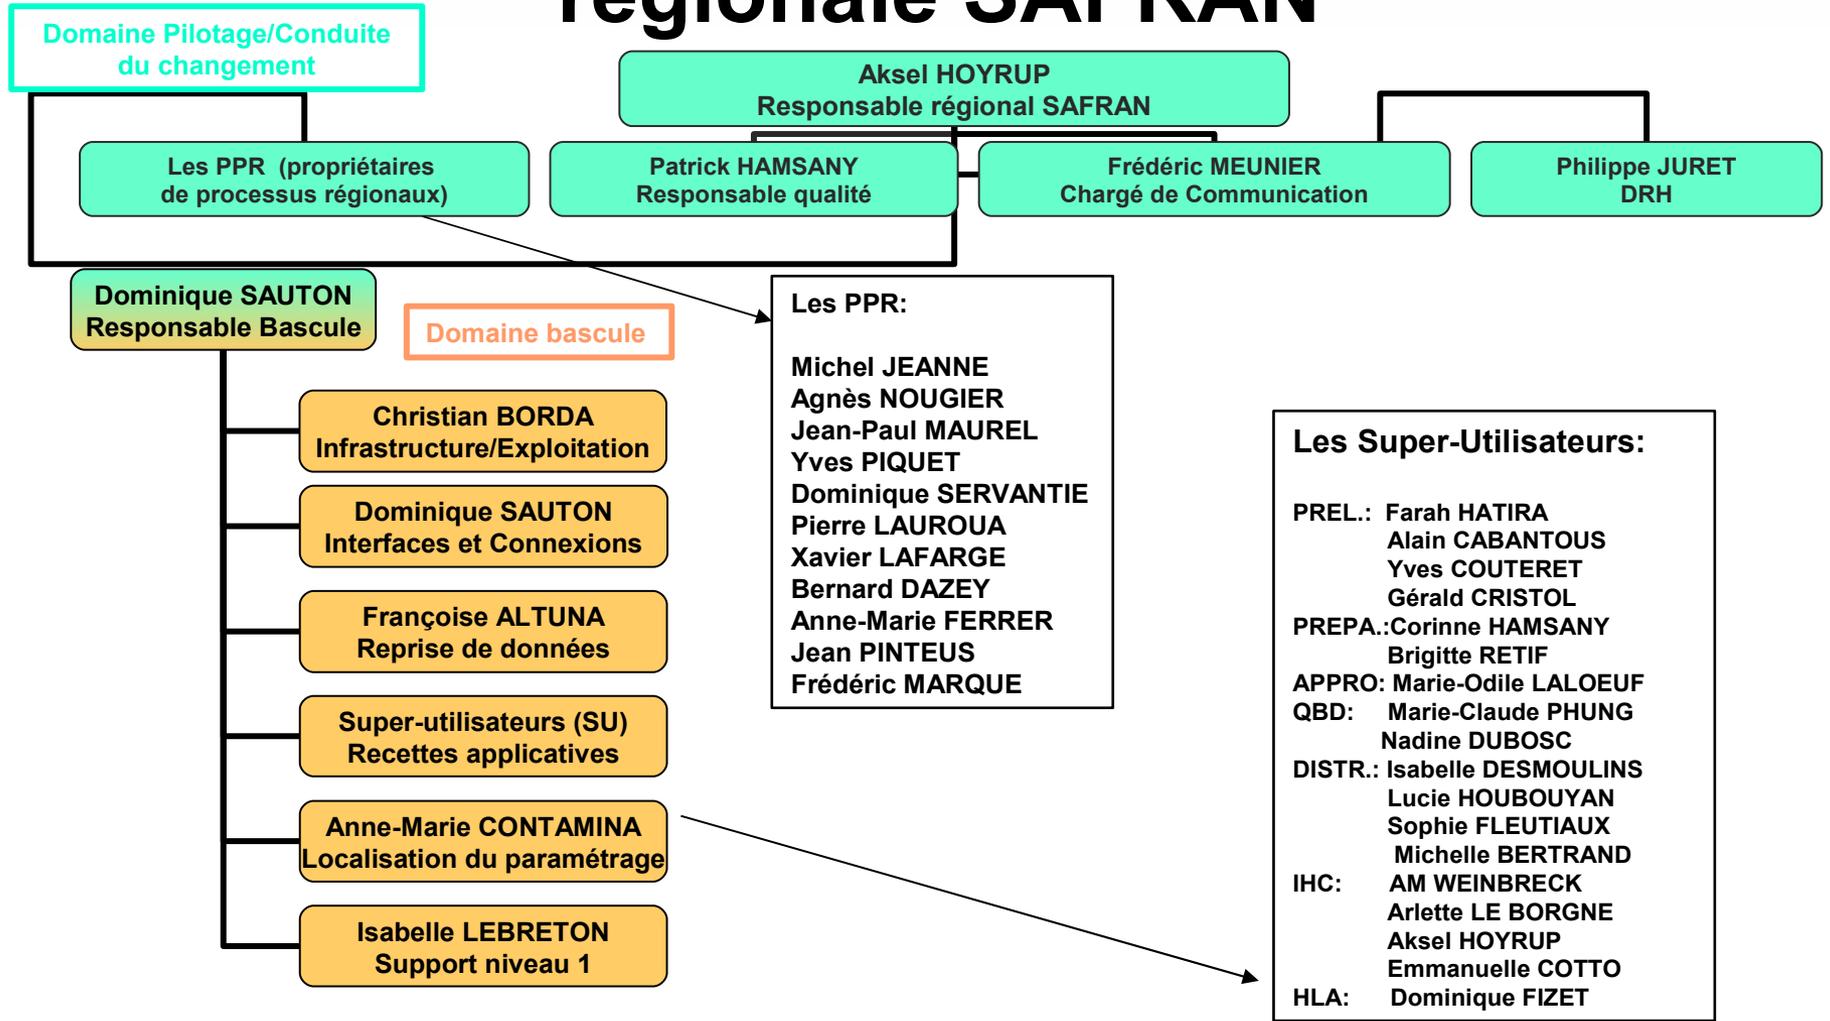


Ce qui est en cours de réalisation:

- **Les différents chantiers ont démarré:**

- **Pilotage:** mise en place du Comité de Pilotage régional (réunions tous les mois) et du Comité d'Avancement Régional (CAR – réunions bi-mensuelles à partir d'octobre 2006)
- **Formation des utilisateurs:** le planning de formation va être élaboré prochainement
- **Localisation du paramétrage** (nos sites, nos lieux de collecte, nos ES...)
- Elaboration des fichiers de **Transcodage** pour la **reprise des données**
- Mise à niveau du **matériel informatique**
- Etude de **l'impact du nouveau logiciel** sur nos pratiques métier et mise à jour de nos modes opératoires (les modes opératoires du parrain peuvent être consultés sur l'Intranet régional)
- **Communication:** Safran Info paraît tous les deux mois

La reprise des données

SCHEMA DES TESTS DE REPRISE DE DONNEES

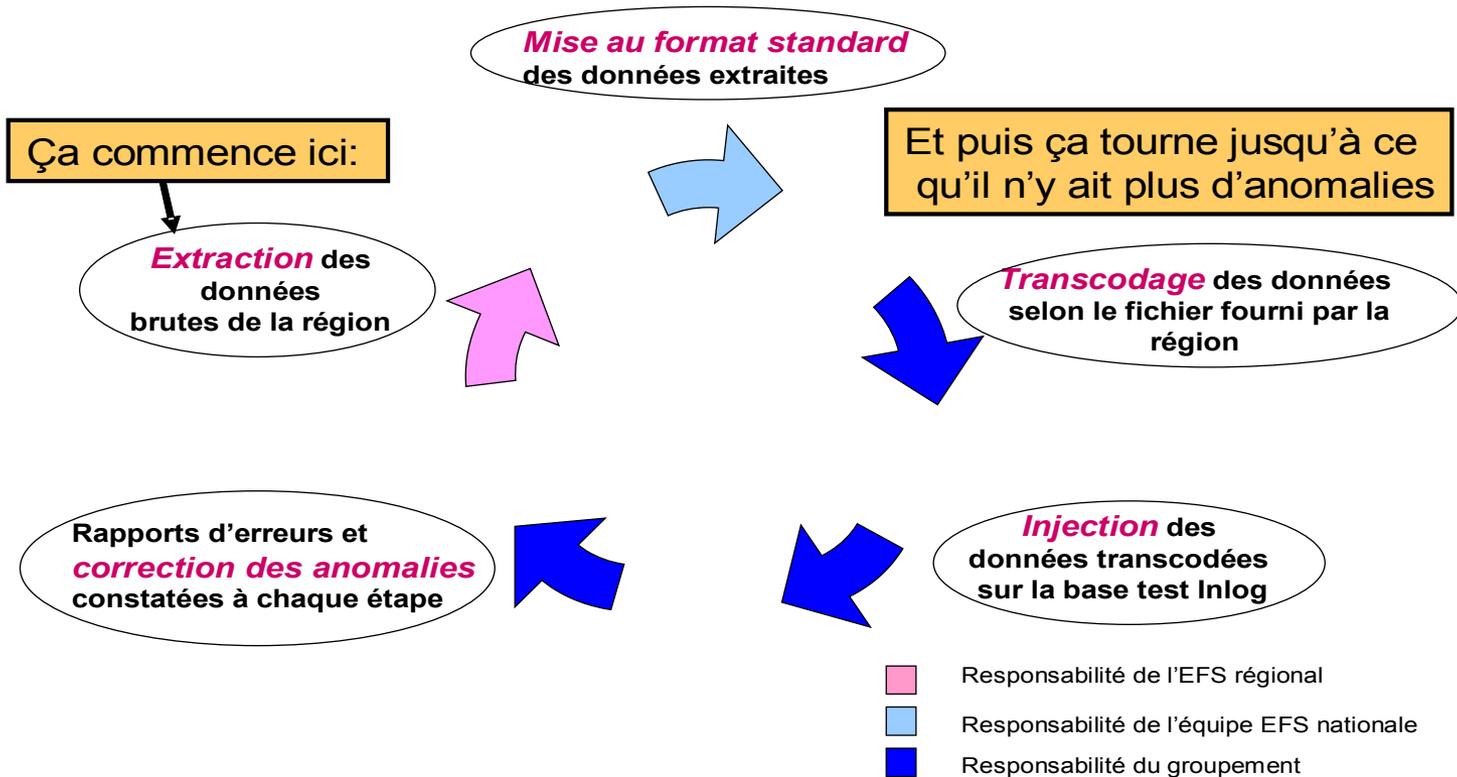

La communication : le flash info

SAFRAN INFO ☺


Numéro 1 – Août 2006

POUR TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE SOLUTION INFORMATIQUE DE L'EFS

EFS Aquitaine Limousin

LE PROJET SAFRAN EN BREF

- Le projet Safran a pour but de mener tous les ETS à utiliser le même logiciel médico-technique.
- Le logiciel commun choisi est celui d'INLOG (CTS-serveur/LABO-Server)
- Il était déjà utilisé par 5 ETS avant le projet Safran.
- Trois de ces 5 ETS (Pays de la Loire, Alpes Méditerranée et Bourgogne Franche Comté) parrainent les 13 ETS qui basculent sur INLOG (voir l'image ci-dessous empruntée à l'intranet Régional de Pays de la Loire):

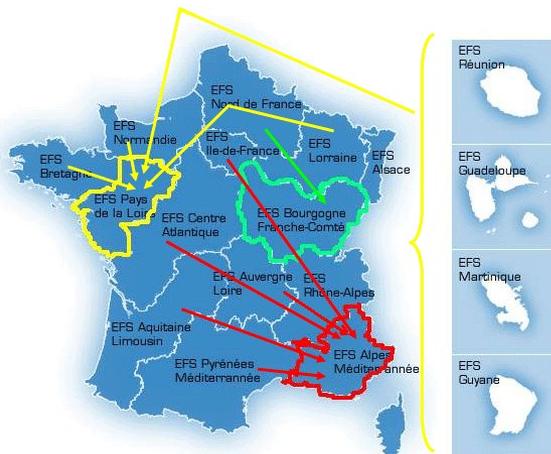

Vous constatez donc que nous avons choisi Alpes Méditerranée comme parrain.

SAFRAN INFO ☺

Numéro 2 – Octobre 2006

POUR TOUT SAVOIR SUR LA NOUVELLE SOLUTION INFORMATIQUE DE L'EFS

EFS Aquitaine Limousin

NOUVEAU PLANNING DES BASCULES

Le nouveau planning des bascules est sorti: **notre bascule est prévue pour le mois de juin 2007.**

L'équipe nationale EFS a modifié ce planning dans un but de **sécurisation**, en se basant sur l'expérience de la bascule Pyrénées Méditerranée qui a eu lieu en juin dernier:

- Etalement des bascules** jusqu'à fin 2007 (flexibilité du calendrier)
- Redéfinition des types d'assistance:**
 - prestations du **Groupement**: rôle des déployeurs Capgemini affectés à chaque ETS, rôle des formateurs Capgemini, formations spécifiques faites par Inlog pour l'équipe régionale: = monitorats
 - prestations de **l'équipe nationale**: support au transcodage, programmes d'extraction des données, support technique, suivi, arbitrage
 - prestations des **parrains**: accompagnement des filleuls
- Définition de jalons de suivi** (livraison des données et du fichier de transcodage, préparation de la base EFS-R, entrée en Vérification Intermédiaire, etc.)
- Prise en compte des contraintes** des ETS et du Groupement

Dates prévues pour les bascules des ETS:

Pilote	• Lorraine Champagne	13/10/2006
Groupe 1	• Normandie	12/01/2007
	• Auvergne Loire	02/02/2007
	• DOM Antilles Guyane	23/02/2007
Groupe 2	• Bretagne	30/03/2007
	• Centre Atlantique	20/04/2007
	• Ile de France	11/05/2007
Groupe 3	• Aquitaine Limousin	15/06/2007
	• La Réunion	14/09/2007
	• Nord de France	12/10/2007

BLEU: ETS actuellement sur Progesa (Mak System)
ORANGE: ETS actuellement sur Hematos IIG (Medinfo)
VERT: ETS utilisant actuellement plusieurs logiciels
